


Glemstalschule


Schwieberdingen-Hemmungen

- Vergabe der Möbellieferung
 - Aktueller Sachstand


Bilder Möblierung Neubau EG

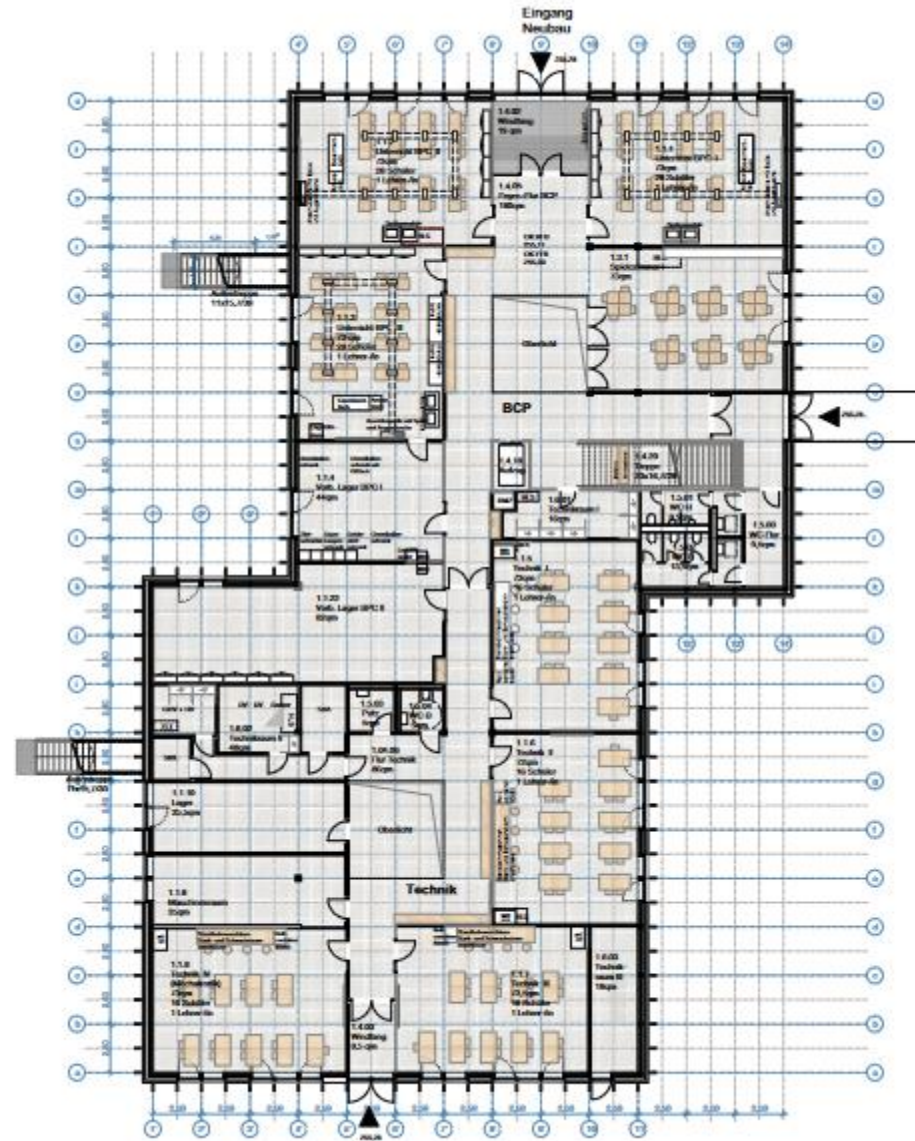


Bilder Möblierung Neubau OG

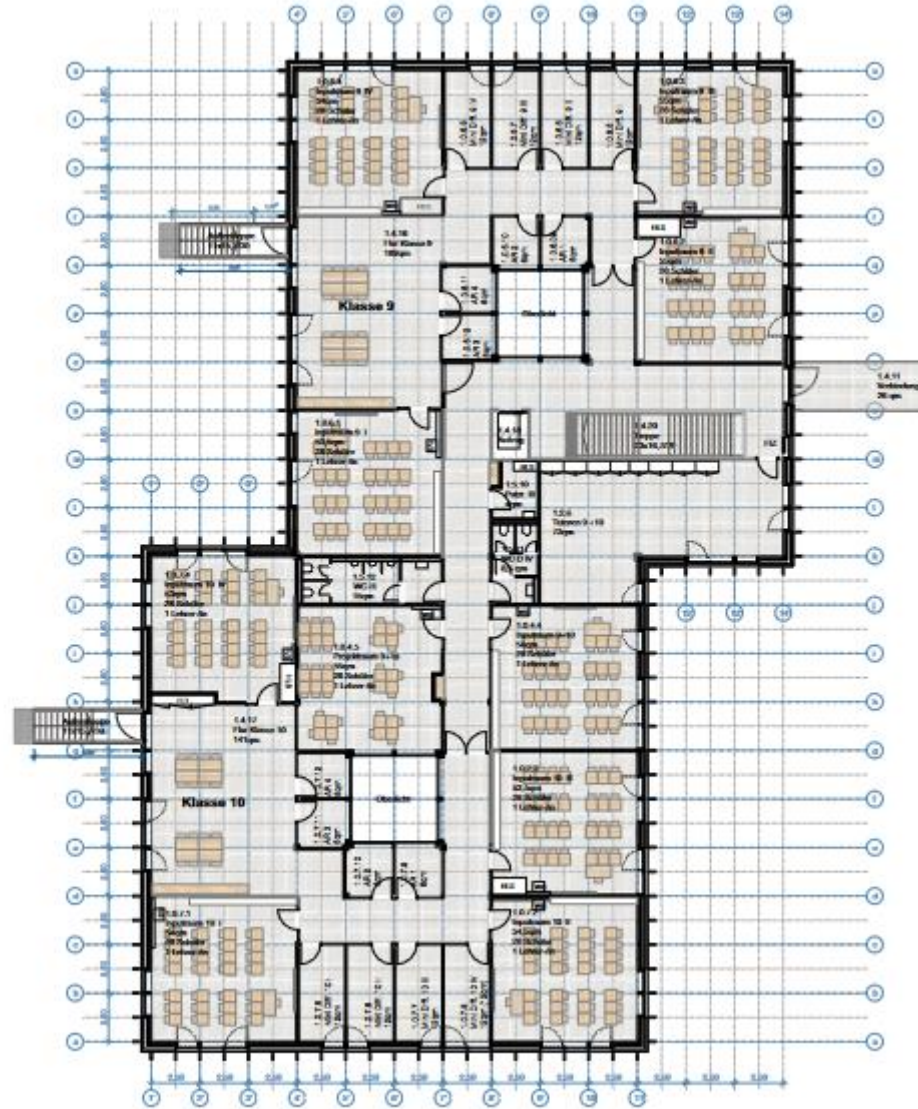

Bilder
Möblierung
Bestand EG

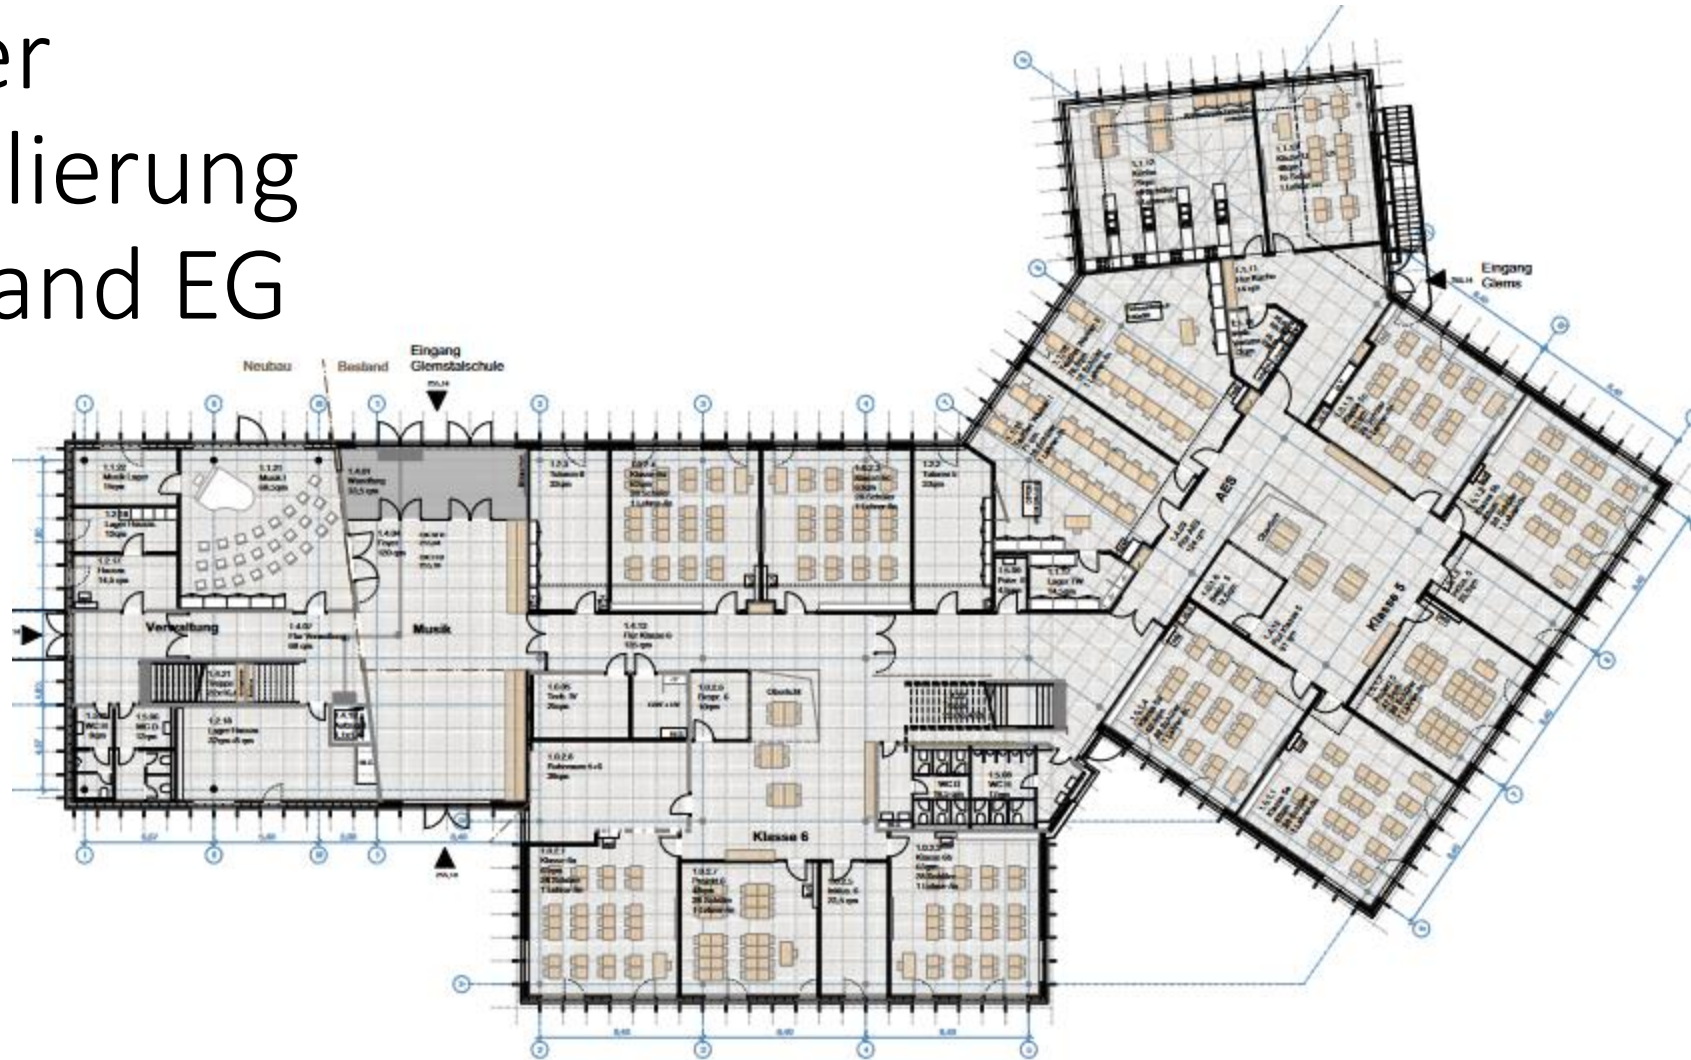



Bilder Möblierung Bestand OG

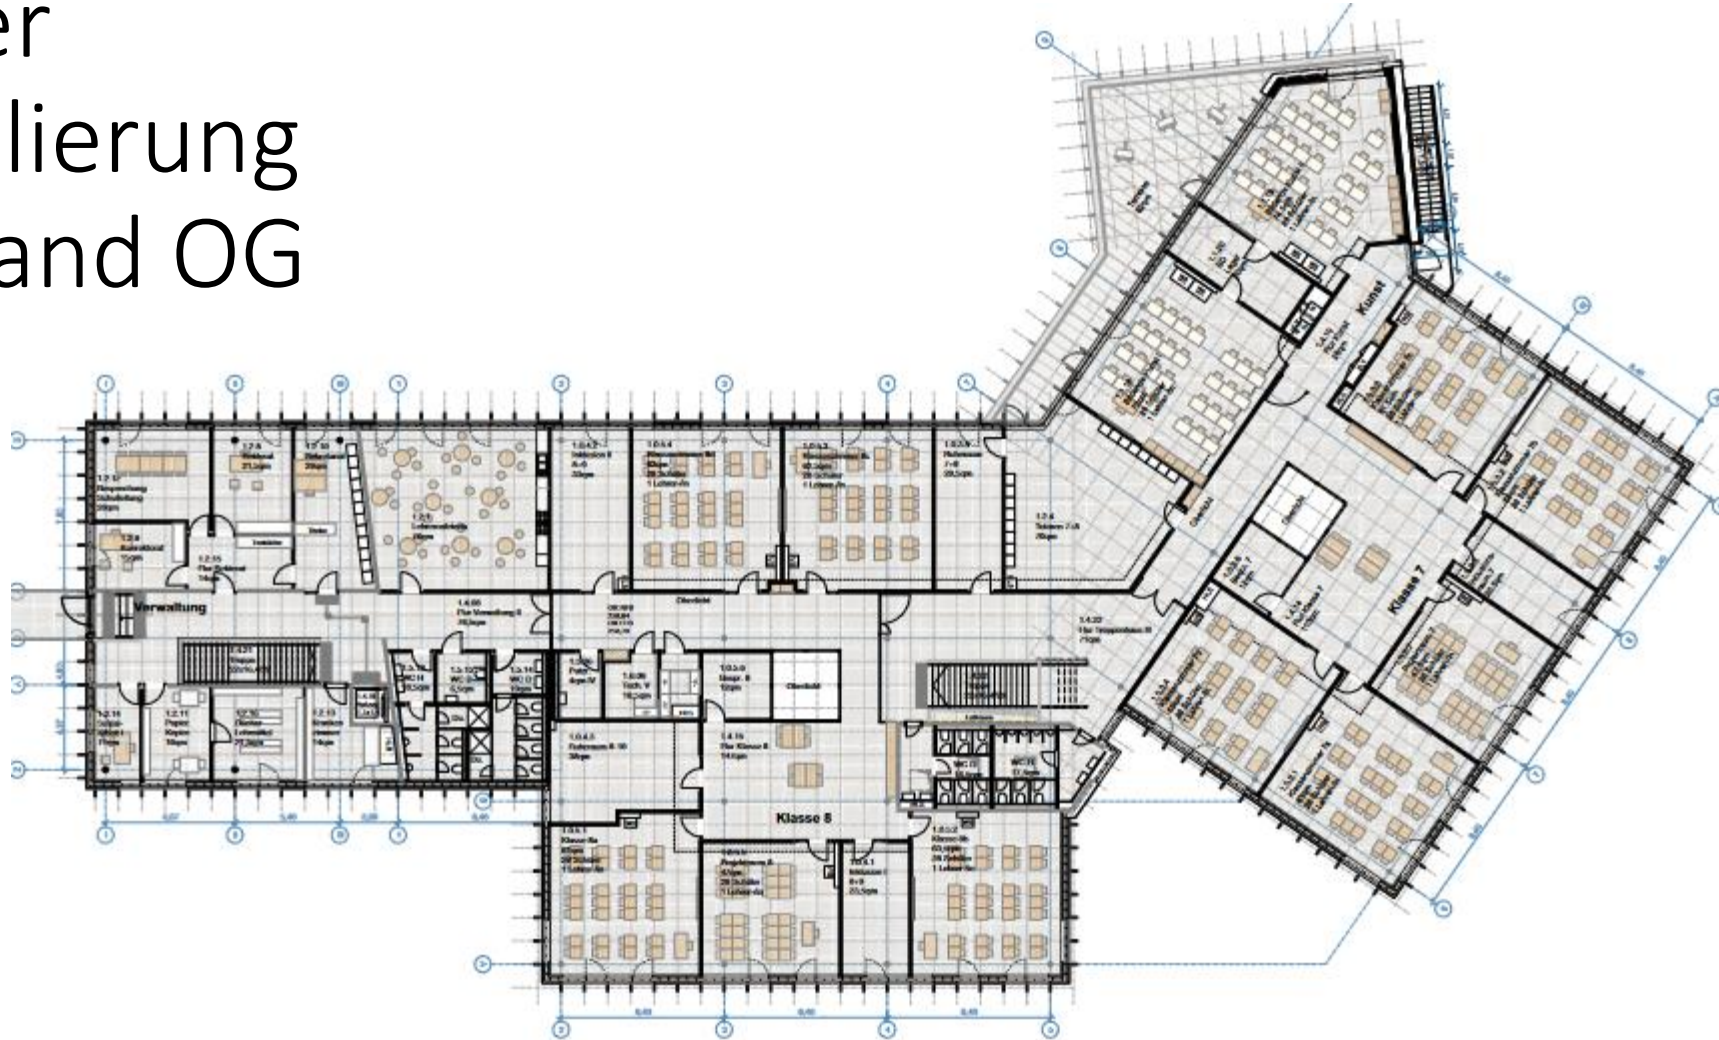

Möblierung



Stühle Klassenzimmer (Freischwinger) in Clusterfarben

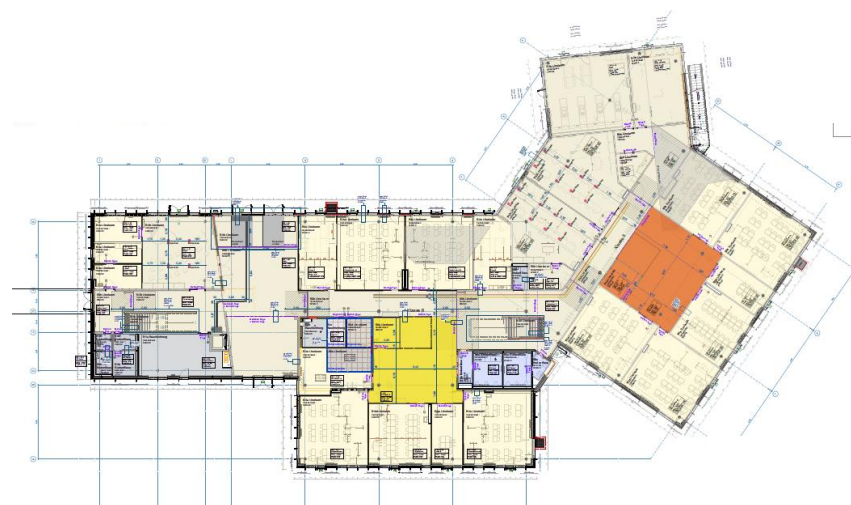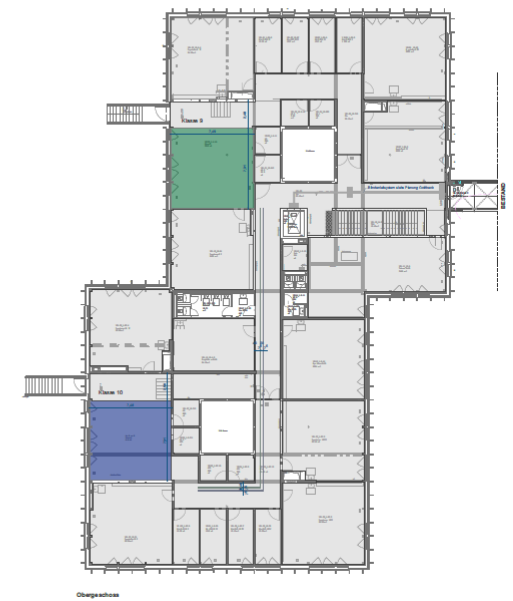

Möblierung



Schülertisch (weiß, Graphit metallic)



Schülerarbeitsschrank für 2 Schüler
(weiß mit Clusterfarbe)



Multifunktionales
Wandschienensystem

Möblierung Clusterbereich



Möblierung in Clusterfarbe,
Tischplatte weiß,
Gestell Graphit metallic



Möblierung Mini-Differenzierungsräume



Möblierung Foyer Bestand



Möblierung Lehrerpult



Bilder Baustelle



Bilder Baustelle



Bilder Baustelle




Bilder Baustelle




Bilder Holzfassade




Beschriftung

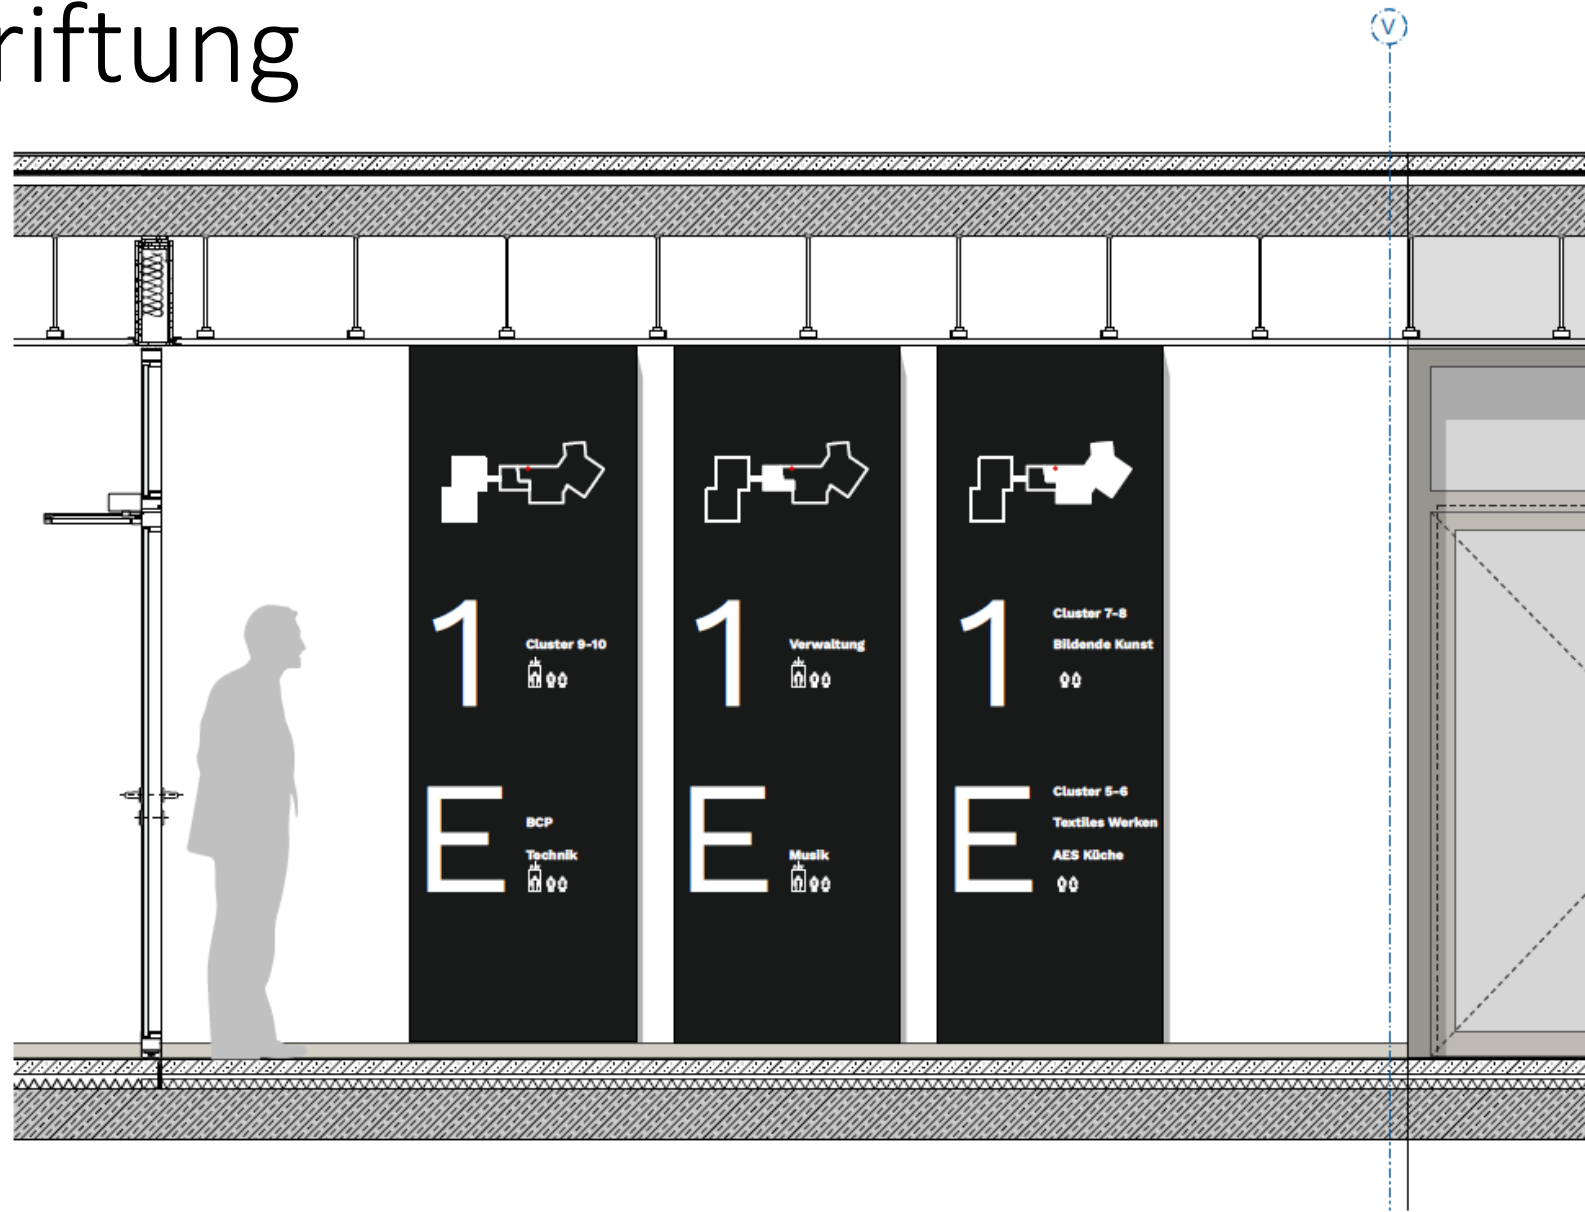


Beschriftung

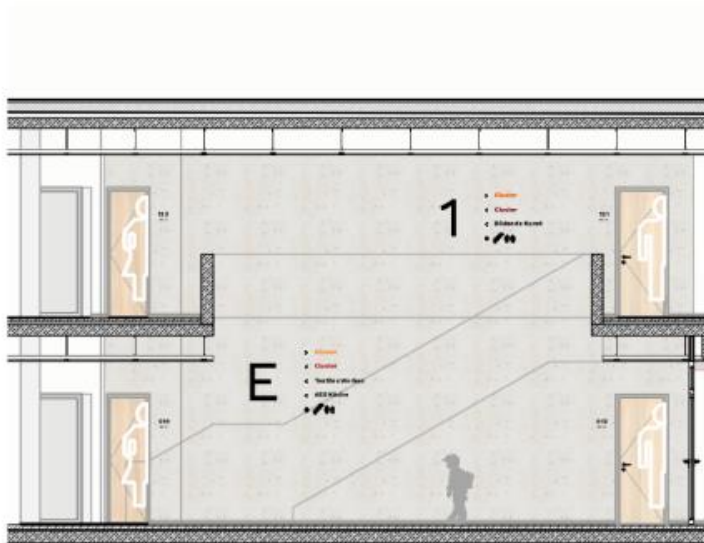


Bestand

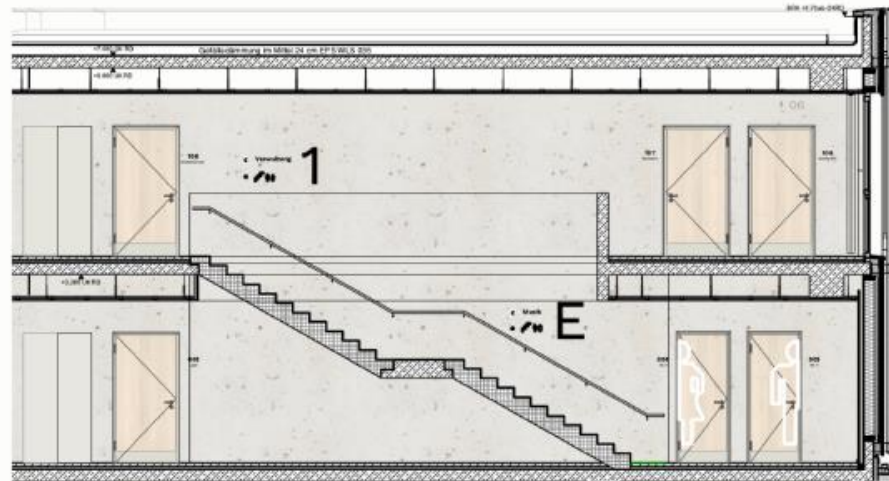


Anbau

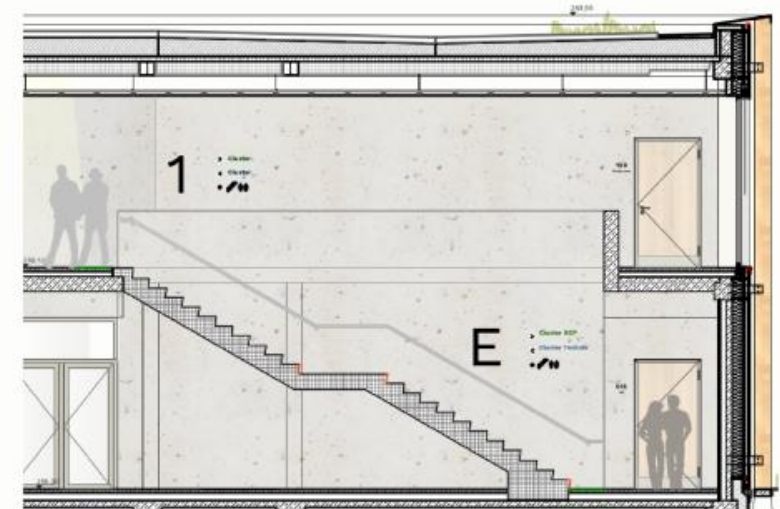


Neubau

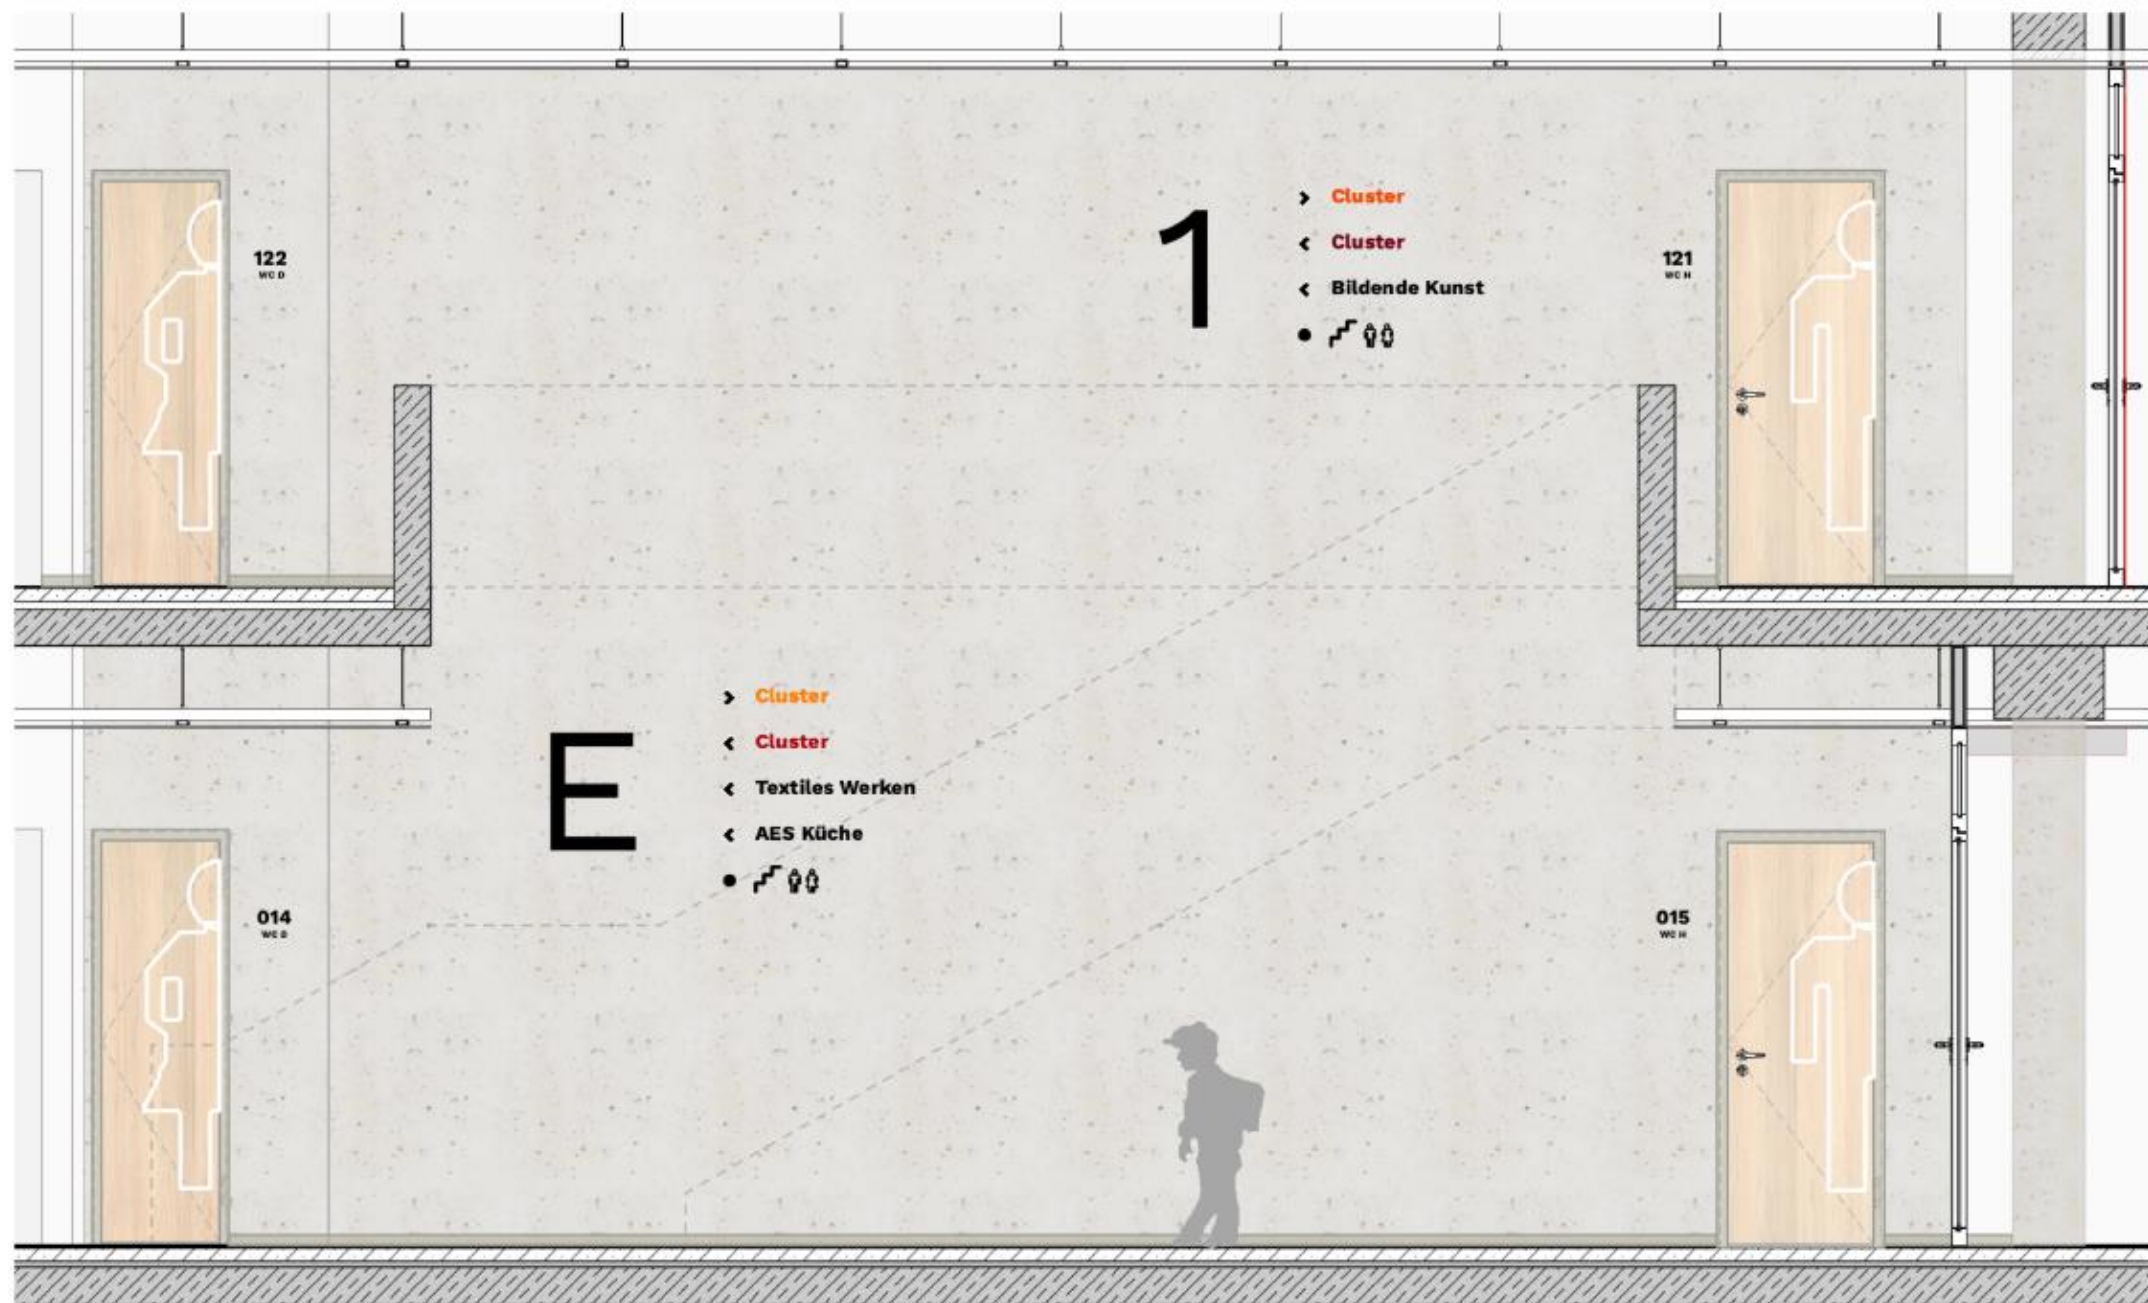


Beschriftung

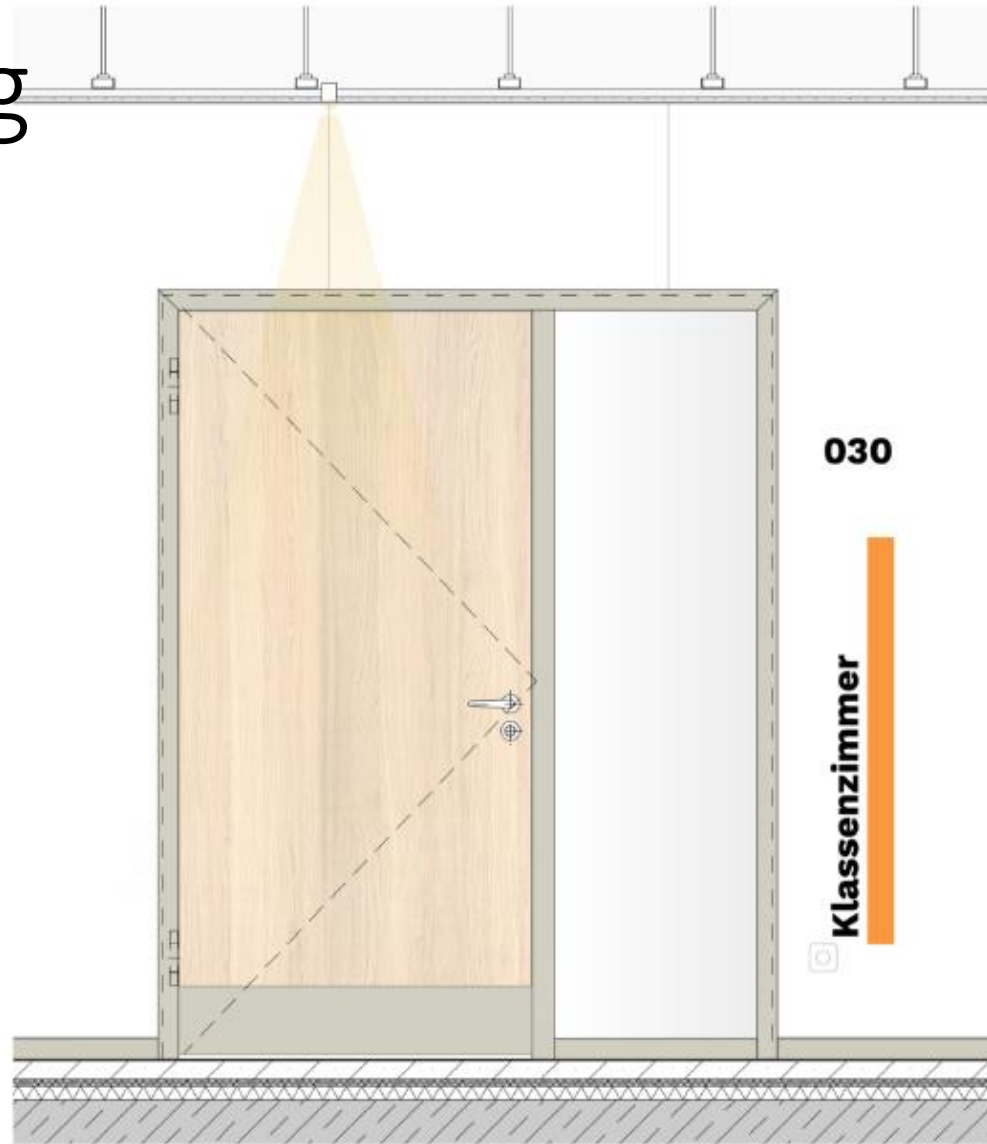

Bilder Fledermausquartiere in neuer Fassade Bestandsgebäude

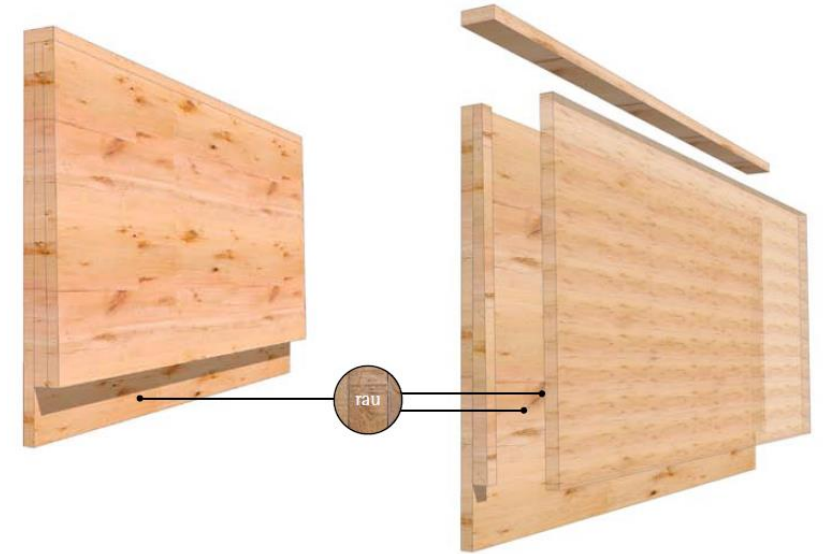

Ansicht Süd-Ost

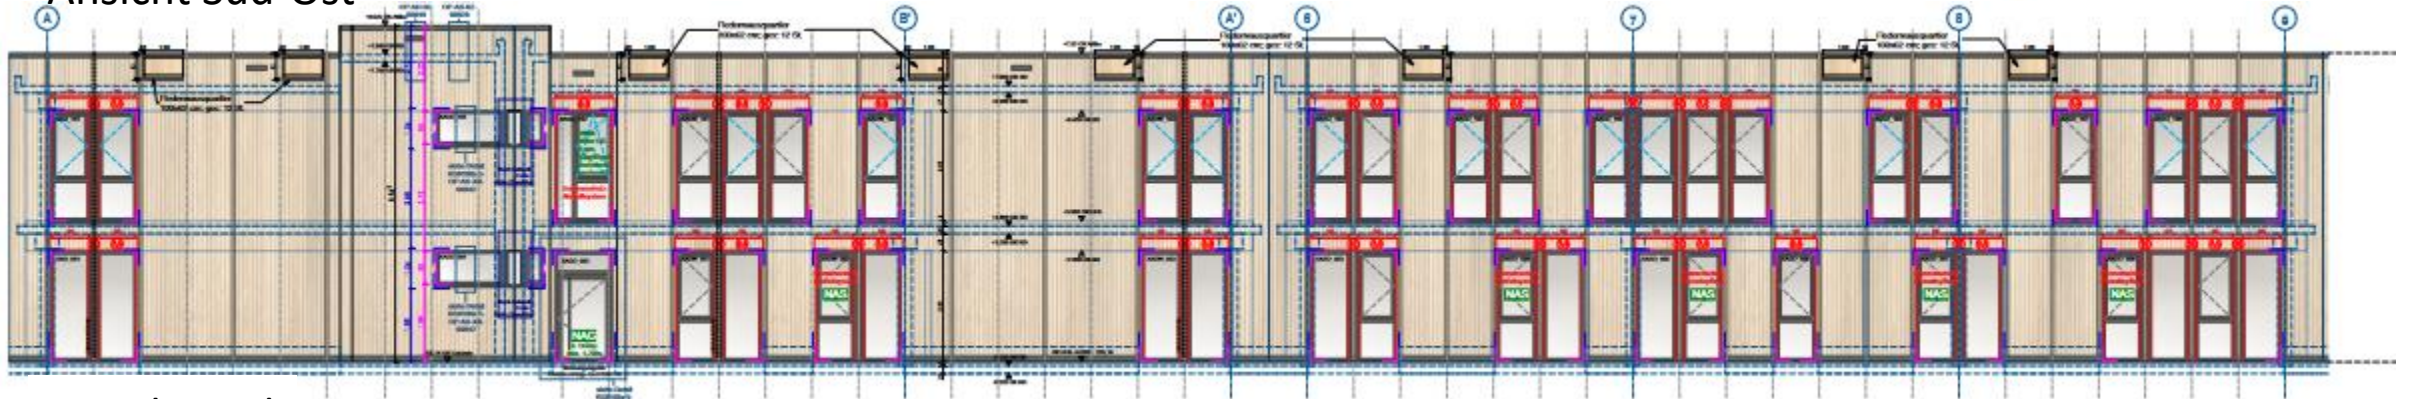

Ansicht Süd



Sanierung des Bestandsgebäudes

- Ausnahmegenehmigung vom RP für die Bestandssanierung ist erteilt
- Während des Rückbaus der Bestandsfassade ist eine artenschutzrechtliche Begleitung erforderlich
- Durch die erforderliche Begleitung durch einen Artenschützer kann der Abbruch nur in Etappen und unter größter Sorgfalt erfolgen
- Durch den zu erwartenden erhöhten Zeitaufwand ist mit Mehrkosten zu rechnen
- Sollten doch noch Zwergfledermäuse hinter der Fassade sitzen werden diese händisch umgesiedelt
- Verletzte Tiere müssen in Obhut gebracht werden
- Parallel hierzu muss ein weiteres Monitoring von 5 Jahren erfolgen mit jeweiligen Jahresberichten
- Sollte kein Erfolg nachgewiesen werden können muss das Monitoring entsprechend verlängert werden
- Nach aktuellem Stand ist durch die Bauzeitverlängerung um mehr als ein Jahr mit Mehrkosten in Höhe von 1,6 Mio € zu rechnen.

Zeitplan: Interimsanlage

- Anfang Juni erfolgen die Erdarbeiten sowie die Anschlussarbeiten für die Strom, Wasser und Abwasserversorgung der Interimsanlage
- Die Aufstellung der Anlage erfolgt im Juli
- Der Abnahmetermin ist auf den 28.07. terminiert.
- Der Umzug erfolgt in den Sommerferien in die Interimsanlage
- Die Möbellieferung für den Erweiterungsbau erfolgt im Zeitraum 14.08.-18.08.
- Die Sanierung im Bestand startet ab 16.10.
